


C&E · Consulting und
Engineering GmbH



pbs
planungsbüro
schumacher
gmbh



WIEDERAUFBAU NACH STARKREGEN- U. HOCHWASSERWASSER KATASTROPHE

IM JULI 2021



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



Aktuelle Übersicht zu Sanierungsmaßnahmen

- Swistbachgrundschule
- Fließgewässer
- Übergangwohnheime
- Feuerwehrtore Straßfeld & Dünstekoven
- Dorfhaus Miel
- Archiv & Obdach
- Turnhalle Odendorf
- Fließgewässer
- Gemeindestraßen
- NA Modellierung
- Friedhofsmauern Miel und Ollheim
- Orbachstraße
- B-Plan Verfahren Sportcampus
- Nachmeldungen von Schäden im WAP



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 1-8 Swistbachgrundschule

Gesamtabnahme erfolgte am 18.12.2023

Gesamteinbetriebnahme nach den Weihnachtferien 2023





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 1-10 Feuerwehr Heimerzheim

Die Löschgruppe Heimerzheim hat im Juni 2023 eine Interimslösung bezogen





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 1-13/14/16 Übergangsheime Schützenstraße

Für die Übergangswohnheime wurde mittlerweile die 2. Runde einer GU-Ausschreibung gestartet. Aktuell läuft die Prüfung und Auswertung der Angebote. Baustart ist für Mitte Juni geplant.





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 8-22 Übergangsheime Kölner Str. und Bahnhofsstraße





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 2-4 Feuerwehrtore Dünstekoven Erneuerung Feuerwehrtor als Sektionaltor





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 2-4 Feuerwehrtore Straßfeld Erneuerung Feuerwehrtor als Sektionaltor





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 5-5 Dorfhaus Miel

Die Ausschreibung der Gutachterleistung befindet sich in der 3. Runde.





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 6-10 Archiv & Obdach






Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 6-10 Archiv & Obdach

Nach bisher erfolglosen Ausschreibungen wurden die einzelnen Gewerke in eine GU-Ausschreibung zusammengefasst. Submission war an 16.04.2024 – Fristverlängerung aufgrund von Bieterfragen.

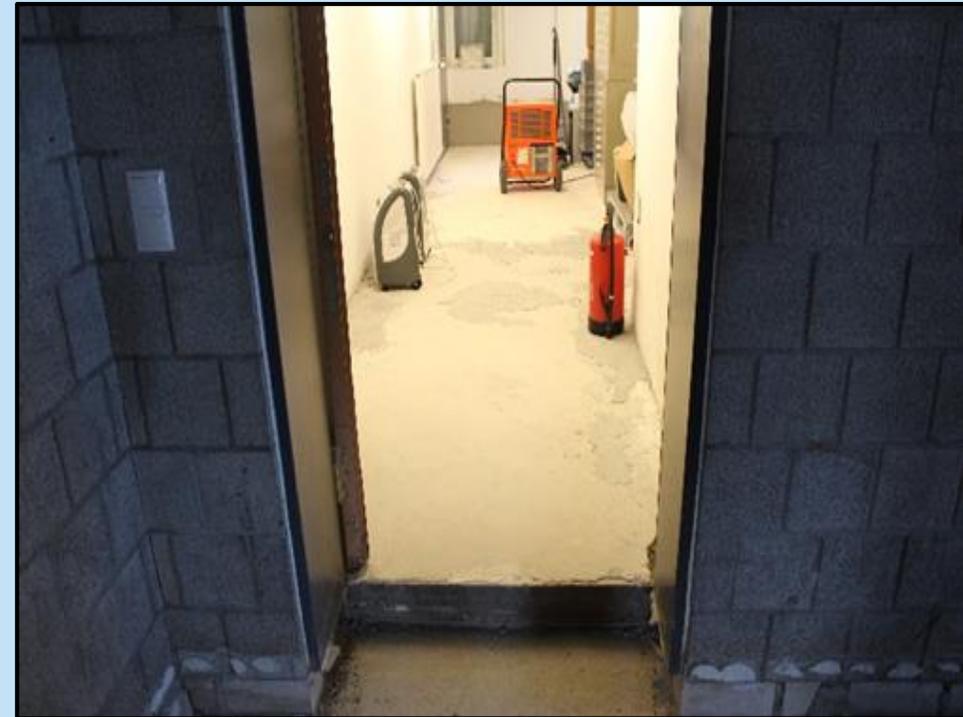



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 8 – 17 Turnhalle Odendorf

Rückbau und Entsorgungskonzept nebst Prüfbericht liegt vor. Ausschreibung wird Anfang Mai gestartet. Als Interimslösung wird eine Fertigteilhalle favorisiert. Ausführung kann erst nach Kampfmittelfreimeldung erfolgen.





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 1-5, M 2-2, M 4-1, M 5-3, M 8-7, M 9-3 und M 10-01 Fließgewässer

Die Auswertung der Flächen als Kampfmittelverdachtsflächen ist zu 80 % abgeschlossen. Nach Auswertung wird eine Vergabestrategie entwickelt, welche Gewässer bei der Ausschreibungen priorisiert werden.





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 1-1, M 2-3, M 4-2, M 5-4, M 6-3, M 8-8, M9-4 Sanierung Gemeindestraßen

Die Vergaben der






Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



NA Modellierung (Außengebietszuflüsse Neukircher Weg u. Kuchenheimer Weg etc.)



Kottengrover Maar

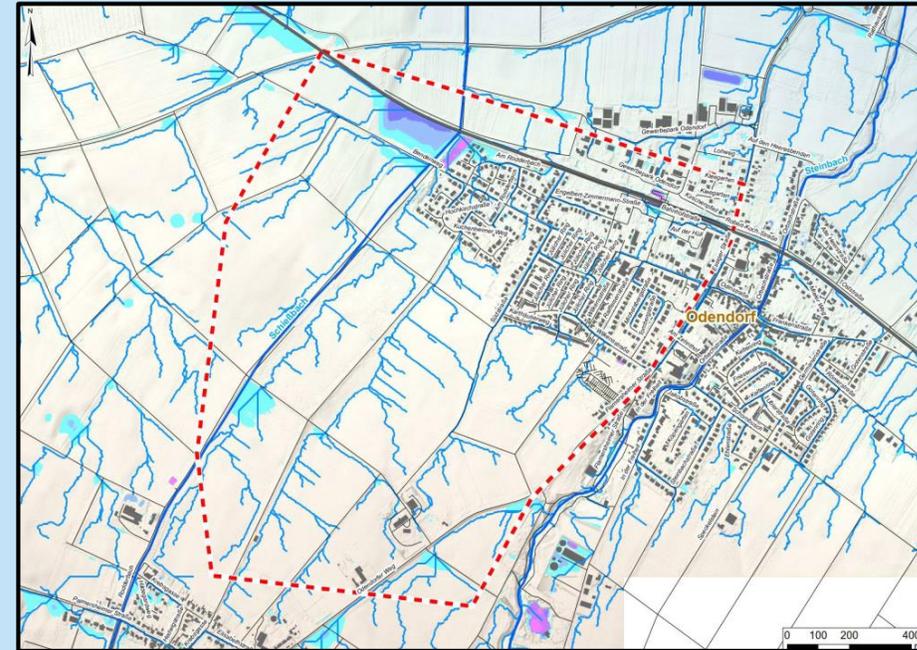

Kuchenheimer Weg




Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021

NA Modellierung (Außengebietszuflüsse Neukircher Weg u. Kuchenheimer Weg etc.)



Neukircher Weg

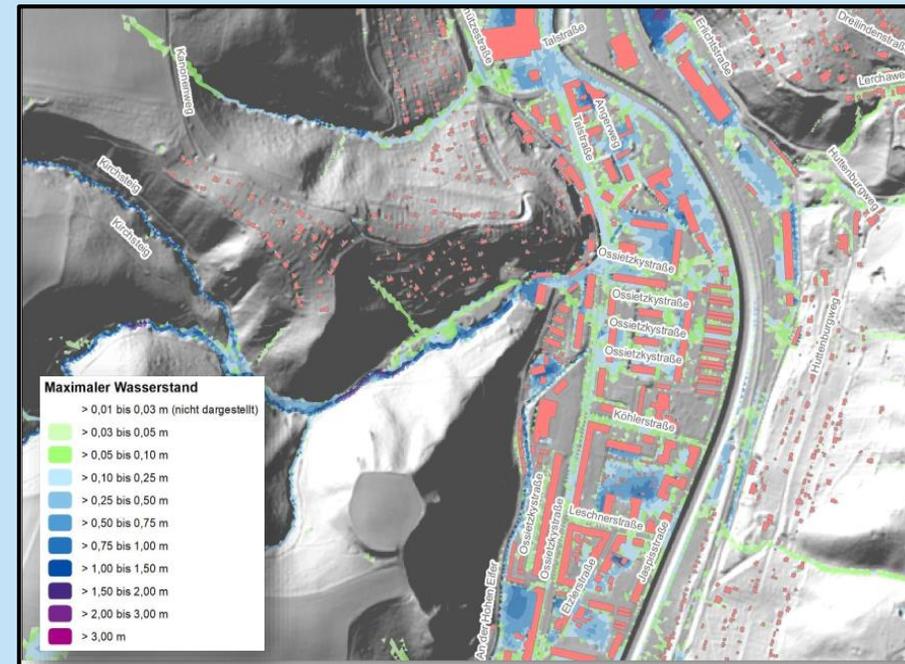



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 5-2 Denkmäler/ Friedhof Miel

Die Friedhofsmauer ist in Abstimmung mit der Denkmalbehörde fertiggestellt. Mit der Fertigstellung der Mauerkrone Anfang Mai ist die Sanierung größtenteils abgeschlossen.





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 5-2 Denkmäler/ Friedhof Ollheim

Die Ausschreibung der Mauer wird aktuell vorbereitet. Der Auftrag erfolgt mittels Direktvergabe.





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 8-10 Sanierung Orbachstraße

Der Erftverband hat ein Konzept für die Sanierung der Stützmauern entlang des Orbachs entwickelt. Geplant ist eine Sanierung des Bachbettes mit punktuellen Verbesserungen des Hochwasserschutzes, Sanierung der Orbachstraße und des Kanals. Um eine aktuelle Planungsgrundlage für alle Gewerke zu haben, wird die Orbachstraße aktuell digital vermessen und ein digitales Geländemodell erstellt.





Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



M 8-19 Sportcampus Odendorf

Die erste Beteiligungsstufe ist erfolgt. Die Stellungnahmen werden ausgewertet. Abstimmungen mit der PLEdoc GmbH Geodatenmanagement (Gasleitung) und dem Landesbetrieb Straßen NRW sind angelaufen. Die Kampfmittelsondierung ist aktiv. Nach Kampfmittelfreimeldung kann die Prospektion der Denkmalpflege beginnen. Die EU Verfahren sind in der finalen Phase. Die restlichen 20 % werden nach Beendigung des UVgO Verfahren direkt vergeben. Verhandlungen sind bereits erfolgt



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



Nachmeldungen im WAP

Sanierung Gemeindesstraßen

z.B. Absackungen Tombergstraße, Gottfried-Velten-Platz, Michelsbergstr. 6-8,
Kanalschäden, Durchlass (Einsturz) im Bereich B56/ Sportplatz Buschhoven

Regenrückhaltebecken RRB Schießbach bei Ollheim

Im Rahmen der Ermittlung der Retentionsräume durch den Erftverband zeichnen sich zusätzliche Bedarfe auf dem Gemeindegebiet Swisttal ab. Die sollten auch baulich im Rahmen des Hochwasserschutzes umgesetzt werden können.

Regenrückhaltebecken RRB Swist bei Heimerzheim

Im Rahmen der Ermittlung der Retentionsräume durch den Erftverband zeichnen sich zusätzliche Bedarfe auf dem Gemeindegebiet Swisttal ab. Die sollten auch baulich im Rahmen des Hochwasserschutzes umgesetzt werden können.



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



Nachmeldungen im WAP

Offenlegung der Verrohrung Rodderbach/ Schießbach bei Odendorf

Im Bereich Odendorf ist der Rodderbach an der Stadtgrenze zu Euskirchen noch auf einem längeren Stück verrohrt. Diese Verrohrung stellt ein Abflusshindernis da. Sie sollte, zur Verbesserung des Hochwasserschutzes offengelegt werden, damit das Abflusshindernis entfällt.

Kanalisation entlang Orbach bei Odendorf

Die genaue Untersuchung der Kanalisation in Odendorf nach der Flut hat ergeben, dass die Kanalisatin im Bereich der Orbachstraße nicht ausreichend leistungsfähig ist. Die Orbachstraße ist in ihrer Gesamtheit nach dem Flutereignis und nach dem privaten Wiederaufbau vollumfänglich sanierungsbedürftig.



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserkatastrophe im Juli 2021



Nachmeldungen im WAP

NA Modellierung zum Schutz vor Außengebietszuflüssen

Im Rahmen des Projektes M11-9 werden Maßnahmen entwickelt, wie die Gebiete vor Außengebietszuflüssen geschützt werden können. Diese Maßnahmen müssen zur Verbesserung der Gesamtsituation auch umgesetzt werden.

Schutz vor Außengebietszuflüssen als Maßnahme aus Bürgerworkshops

Bei den Bürgerworkshops zur Hochwasserschutzkooperation wurden auch kleine Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes vorgetragen.

Schutz von Grabenzuläufen vor Verlegung als Maßnahme aus Bürgerworkshops



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



Nachmeldungen im WAP

Wiederherstellung einer zerstörten Ausgleichfläche in der Gemarkung Essig
Flur 3, Flurstück 207/103

Sport- Campus Odendorf Planung und Erschließung einschl. Grunderwerb

Sanierung Dorfhaus Straßfeld – Maßnahme M10

Wiederbegrünung der Orbachaue

Provisorische Fußgängerbrücke „An der Burg“ in Odendorf



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe im Juli 2021



Nachmeldungen im WAP

Rund um`s Rathaus

Diverse Kleinstmaßnahmen wie z.B. Außenbereiche, Druckerstraße, Materiallager, Möblierung etc.

Sanierung der Friedhofshallen Miel und Ludendorf

Unterstützung zu Schadensabwehrmaßnahmen



Wiederaufbau nach Starkregen- u. Hochwasserwasserkatastrophe
im Juli 2021



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
